

## **République du Niger**

---

### **Projet de Petite Irrigation Ruwanmu (PPI Ruwanmu)**

### **Rapport de supervision**

### **Rapport principal et appendices**

Dates de la mission: 12 au 23 juin 2017  
Date du document: 25/09/2017  
No. du Projet: 1100001646  
No. du rapport: 4520-NE

Division Afrique de l'Ouest et du Centre  
Département gestion des programmes



## Table des matières

Sigles et acronymes	iii
A. Introduction	1
B. Vue d'ensemble de l'exécution du Projet de Petite Irrigation Ruwanmu (PPI Ruwanmu)	2
C. Produits et effets	3
D. État d'avancement de l'exécution du Projet de Petite Irrigation Ruwanmu (PPI Ruwanmu)	5
E. Aspects fiduciaires	5
F. Durabilité	9
G. Autres: Achèvement du PPI Ruwanmu et du PUSADER+	9
H. Conclusion	10

## Appendices

Appendice 1:	Résumé de l'état d'avancement du PPI Ruwanmu et notes attribuées	11
Appendice 2:	Cadre logique actualisé: état d'avancement par rapport aux objectifs, effets et produits (actualisé au 31/05/2017)	13
Appendice 3:	Récapitulatif des principales mesures à prendre dans les délais convenus	19
Appendice 4:	État d'avancement matériel par rapport au PTBA (y compris indicateurs SYGRI)	20
Appendice 5:	Aspects financiers: performance financière effective par bailleur de fonds et par composante, et décaissements par catégorie	21
Appendice 6:	Application des dispositions de l'Accord de Financement: état d'avancement	25

## Sigles et acronymes

ACAP	Appui Conseil Agricole Paysans
AcSAA	Actions pour la Sécurité et la Souveraineté Alimentaires
AFV	Actions pour les Femmes Vulnérables
AS	Activité Structurante
ASAP	Fonds Fiduciaire pour le Programme d'Adaptation de l'Agriculture Paysanne
ATJ	Assistant Technique Junior
ATN	Assistant Technique National
ATNS/IP	Assistant Technique National Senior en Ingénierie de Projet
ATNS/DP	Assistant Technique Senior en Dialogue Politique
AUE	Association des Usagers de l'Eau
BAGRI	Banque Agricole
BEEI	Bureau d'évaluation et d'étude d'impact environnemental
BER	Brigade d'Entretien Routier
CAFER	Caisse Autonome pour le Financement de l'Entretien Routier
CCIAN	Chambre de Commerce d'Industrie et d'Artisanat du Niger
CCIN	Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger
CCS	Centre de Collecte Satellite
CENAT	Cellule Nationale d'Assistance Technique
CEP	Champ Ecole Paysans
CEPM	Champ Ecole Paysans Maraîchers
CES/DRS	Conservation des Eaux et Sols/Défense et Restauration des Sols
CMNN	Commission Mixte Nigéro Nigérienne de coopération
CMR	Cadre de Mesure de Résultats
Comp	Composante
CRA	Chambres Régionales d'Agriculture
CTL	Cellule Technique Locale
DAO	Dossier d'Appel d'Offre
DCP	Document de Conception du Programme
DGGR	Direction Générale du Génie Rural
DIPE	Démonstrations d'Initiatives Paysannes en Elevage

DRA	Direction Régionale de l'Agriculture
DREL	Direction Régionale de l'Elevage
FFE	Fonds Fiduciaire Espagnol
FIDA	Fonds International de Développement Agricole
FISAN	Fonds d'Investissement pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
GACAP	Groupeement d'Appui Conseil Agricole Paysans
GIE	Groupeement d'Intérêt Economique
GSC	Groupeements des Services Conseils
HG	<i>Hadin Gwiwa</i>
i3N	Initiative 3N, les Nigériens Nourrissent les Nigériens
ICRISAT	International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropic
IF	Institutions de Financement
IMF	Institution de Micro Finance
INRAN	Institut National des Recherches Agronomiques du Niger
INSAH/CILSS	Institut du Sahel/Comité Inter état de Lutte Contre la Sécheresse au Sahel
IR	Instances Rurales
IRE	Intégration Régionale des Echanges
JDC	Jardins de Cases
LAE	Lettre à l'Emprunteur
LFSN	Leadership et Sécurité Nutritionnelle
MAG	Ministère de l'Agriculture
MAG/EL	Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage
MDG	Marchés de Demi Gros
MER	Micro Entreprise Rurale
Mi	Maradi
NODEF	Nouvelles Opportunités pour les Défavorisés
OFID	OPEP Fund for International Development
OMD	Objectifs du Millénaire pour le Développement
ONG	Organisation Non Gouvernementale
OP	Organisation Paysanne
P1	Phase 1
P2	Phase 2

P3	Phase 3
P4	Phase 4
PAM	Programme Alimentaire Mondial
PAMIRTA	Projet d'Accès aux Marchés et Infrastructures Rurales de Tahoua
PASADEM	Projet d'Appui à la Sécurité Alimentaire et au Développement dans la région de Maradi
PDE	Pôles de Développement Economiques
PDES	Plan de Développement Economique et Social
PFC	Plateforme de Commercialisation
PPI	Projet de Petite Irrigation
PPM	Plan de Passation des Marchés
PRACC	Programme Régional d'Appui à la Croissance et à la Compétitivité
ProDAF	Programme de développement de l'agriculture familiale
PTBA	Programme de Travail et Budget Annuel
PUSADER	Programme d'Urgence pour l'Appui à la Sécurité Alimentaire et au Développement Rural
RC1	Responsable Composante 1
RC2	Responsable Composante 2
RECA	Réseau des Chambres de l'Agriculture
Resp	Responsable
SAF	Service Administratif et Financier
SAHEL	Salon de l'Agriculture, de l'Hydraulique et de l' Elevage
SG	Secrétaire Général
SIG	Système d'Information Géographique
STD	Services Techniques Déconcentrés
STR	Services Techniques Régionaux
SVPP	Service Vétérinaire Privé de Proximité
SYGRI	Système de Gestion des Résultats et de l'Impact
Ta	Tahoua
TDR	Termes de Référence
URGP	Unités Régionales de Gestion du Programme
Zr	Zinder





## A. Introduction<sup>1</sup>

1. Une mission de supervision conjointe du Programme de Développement de l'Agriculture Familiale (ProDAF) dans les régions de Tahoua, Maradi et Zinder, conduite par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) et le Gouvernement du Niger s'est déroulée en République du Niger, du 12 au 23 juin 2017. Cette mission avait pour objectif général d'examiner le niveau d'avancement de la mise en œuvre de ce programme en prenant en compte l'ensemble de ses guichets de financement, notamment les projets en cours d'achèvement à savoir le Projet de Petite Irrigation (PPI *Ruwanmu*) et le Projet d'Appui à la Sécurité Alimentaire et au Développement dans la région de Maradi (PASADEM).
2. De manière spécifique, la mission avait pour objectif de: (i) passer en revue les réalisations techniques et financières du Programme depuis la dernière mission de supervision d'octobre 2016 et (ii) identifier les principales contraintes auxquelles fait face le programme et proposer les mesures correctives.
3. Le Projet petite-irrigation a pour objectif global d'améliorer la sécurité alimentaire des populations rurales dans les régions de Maradi, Tahoua et Zinder et son objectif de développement est d'augmenter les revenus de 65 000 ménages ruraux (455 300 personnes) dans les 30 communes identifiées. Le projet est structuré avec deux composantes techniques: **la composante A "Expansion et renforcement durable des systèmes de petite irrigation"** qui vise l'augmentation durable de la productivité des systèmes d'irrigation et **la composante B "Développement d'infrastructures économiques"** qui renforce les activités de la composante A à travers des infrastructures en aval de la production. Cette composante vise: (i) le désenclavement des bassins de production pour les lier aux marchés urbains à travers 150 km de pistes rurales; et (ii) le développement d'activités de post-récolte et de commercialisation dont 30 plateformes de collecte et 2 comptoirs de commercialisation sur la base des capacités et des besoins spécifiques des OP.
4. Le coût total du projet, imprévus physiques et financiers inclus, est estimé à 11,5 milliards de FCFA soit 25,6 millions de USD. Le projet est financé par: (i) un prêt de 14 millions d'euros du Fonds fiduciaire espagnol (FFE) pour la sécurité alimentaire du FIDA équivalent à 18,76 millions de USD (73,1% du coût total); (ii) un prêt de 1,7 million de dollars du FIDA correspondant au reliquat de l'allocation du PBAS 2010-2012 (7% du coût total); (iii) un don du FIDA à hauteur de 1 million de USD (contribution complémentaire suédoise au FIDA) (3,9% du coût total); et (iv) la contribution du gouvernement sous forme de taxes et de droits de douane pour un montant de 4,1 millions de dollars (16% du coût total).
5. La durée d'exécution du projet, qui est entré en vigueur le 19 février 2013, est de 5 ans, son achèvement est prévu pour le 31 mars 2018 et la clôture le 30 septembre 2018.
6. La majeure partie des activités du PPI Ruwanmu est en phase de finalisation et les activités inscrites au PTBA 2015-2016 sont donc limitées. Dans ce rapport, la mission a également fait le point concernant les travaux des pistes sur guichet PUSADER+.

---

<sup>1</sup> Composition de la mission: L'équipe FIDA était composée de: M. Achancho Valentine, CPM/WCA, Chef de mission FIDA, Kadre Kadei, CPO/WCA, Mme Haoua Sienta, FMD/FIDA, M. Desiré Gueye Massa, consultant en gestion fiduciaire, M. Alain Barbet, agronome, consultant en agriculture familiale durable, Mme Amélie Guiot Zimmermann, consultante en environnement et adaptation au changement climatique, M. Badamassi Djariri, consultant en partenariat / Organisations Paysannes et ingénierie de projets, Mme. Martha Populin, Consultante en Partenariat, suivi-évaluation et ciblage et M. Marius Sanon, consultant en infrastructures rurales. La partie gouvernementale était composée de: M. Abdou Chaibou, Directeur des études et programmation au MAG/EL, Chef de mission Gouvernement, M. Alyou Abdou Ali, DSEI/MP, M. Lemane Ibrahim, HC3N, Mahaman Sani Tassiou, DGGR/MAG/EL, M. Aboubakar Kourna, DGA/MAG/EL, M. Ousseini Halidou DEP/MAG/EL, Cdt Abdel Aziz Harouna Niandou, MEDD. L'équipe du Programme participant à la mission était composée de: M. Assadeck Mohamed, ATNS/DP, M. Guéro Chaibou, ATNS/IP, M. Chaibou Magagi, ATN/CF, M. Saley Sadikou, ATN/SE, M. Issa Saadou, ATN/PR, M. Namata Issa Mamane, ATN/ Agronome. Les URGP étaient représentées par MM. Soumaila Abdoullaye, Coordonnateur/URGP/Maradi, Harouna Traoré, Coordonnateur/URGP/Zinder, Aboubacar Ousmane Gogé, Coordonnateur/URGP/Tahoua, les cadres de leurs URGP respectives, M. Gourgoudou Hadi Abdoulnasser, contrôleur de gestion interne des trois URGP et M. Aly Adamou Mamane, Chargé de communication.

7. Au démarrage, la mission s'est entretenue avec M. Diamoitou Guessibo Boukary, Secrétaire Général du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage. Elle a rendu des visites de courtoisie à M. Ali Bety, Haut-Commissaire aux 3N et le Secrétaire Général de la même structure M. Mahaman Sani Abdou.

8. Du 13 au 20 juin 2017, la mission s'est rendue dans les trois régions de la zone d'intervention du projet – Tahoua, Zinder et Maradi – où elle a été reçue par le Gouverneur de la Région de Zinder, et les Secrétaires Généraux des Régions de Tahoua et de Maradi. Les visites de terrain ont été complétées par des rencontres de travail avec les cadres du ProDAF et des structures partenaires. La mission de terrain a été conclue à Maradi par une séance d'échanges sur les grands constats et recommandations de la mission avec l'équipe du ProDAF incluant les partenaires de mise en œuvre.

9. L'Aide-mémoire de la mission de Supervision a été discuté avec la partie nationale le 23 juin 2017 sous la présidence de M. Yakoubou Mahaman Sani, Directeur General de la Programmation du Développement au Ministère du Plan.

## **B. Vue d'ensemble de l'exécution du Projet de Petite Irrigation Ruwanmu (PPI Ruwanmu)**

10. L'objectif global du PTBA 2017 par rapport au PPI Ruwanmu est de: i) poursuivre le parachèvement des investissements initiés dans le cadre du PTBA 2016; ii) apprécier les effets-impacts générés par le projet et organiser la revue d'achèvement.

11. Deux activités sont prévues dans le PTBA 2017 du Guichet à savoir: l'achèvement des tronçons de pistes PPI au niveau de la région de Zinder au titre de la Composante B et l'organisation de l'enquête d'impact SYGRI final logée dans la Composante C.

12. Le taux d'exécution physique global est de 44% avec 87% pour la composante B et 0% pour la composante C. Ce taux nul au niveau de cette dernière s'explique par le fait que l'activité relative à la conduite de l'enquête d'impact SYGRI n'a pas encore démarré.

13. Le PTBA du PPI Ruwanmu est d'un montant de 547 525 101 F CFA, soit une contribution de 3% au PTBA global du ProDAF. Les réalisations financières se rapportant à ce PTBA, y compris les engagements à liquider s'élèvent à 356 724 329 F CFA au 31 mai 2017, soit un taux de réalisation global de 65%.

14. A l'instar du PASADEM, la performance du PPI Ruwanmu a été négativement impactée par la faible performance des entreprises de Bâtiments et Travaux Publics (BTP) attributaires des contrats des chantiers de pistes en cours dans la région de Zinder.

15. Du fait de ces retards et des incidences financières qu'ils ont entraîné, la mission constate que la situation financière sur le solde résiduel du Projet et ses engagements ne permettront pas de faire face aux dépenses d'achèvement et d'audit de clôture et qu'il convient d'ores et déjà de programmer des fonds de contrepartie à cet effet.

16. *La mission a recommandé de porter une attention particulière sur deux dossiers prioritaires pour le PPI Ruwanmu: (i) mobiliser les fonds de contrepartie afin de couvrir les dépenses liées à l'achèvement du projet; et (ii) finaliser sans délais les deux chantiers résiduels de pistes des lots 1 et 3 dans la région de Zinder.*

## C. Produits et effets

17. Les activités réalisées au titre du PTBA ne concernent que **la composante B, Développement d'infrastructures économiques**

### Travaux de construction/réhabilitation des pistes dans la région de Zinder.

18. Ces travaux concernent un linéaire total de 123,19 km de pistes rurales répartis en trois (03) lots à savoir:

- lot 1 - Guidiguir-Gassafa: 31,95 km
- lot 2 - Bandé-Edo-Baban Ruwa: 48,54 km
- lot 3 - Matameye-Doungou-Majéma: 42,70 km.

19. Les travaux ont démarré courant mai et juin 2015 mais ont connu d'importants retards. En effet, prévus pour un délai initial de 6 mois pour chaque lot, ce délai a été prolongé de 3 mois suite aux recommandations de la mission de revue à mi-parcours du PPI-Ruwanmu et aux demandes formulées par les entreprises. Les travaux qui devraient par conséquent être achevés au plus tard en mars 2016 en tenant compte des différentes suspensions réglementaires de travaux, ont connu une situation de blocage à partir de mars et avril 2016 qui s'est traduite par un arrêt des activités sur l'ensemble des chantiers. La principale raison de cet enlisement des chantiers est le manque d'engins de terrassement en bon état et en nombre suffisant.

20. Dans la recherche de solutions alternatives pour l'achèvement de ces chantiers, les entreprises en charge des lots 1 et 2 ont consenti à sous-traiter l'approvisionnement et la mise en œuvre de la couche de roulement qui constituent la tâche la plus importante des travaux. Des contrats de sous-traitance ont ainsi été élaborés ce qui a permis la reprise des travaux en août 2016 sur ces deux chantiers. Au 31 mai 2017, la situation des travaux est la suivante:

**Tableau 1: Situation des travaux des pistes PPI-Ruwanmu au 31/05/2017**

Lots / Entreprises	Taux d'avancement physique	Taux consommation du délai	Taux de décaissement	Observations
<b>Lot 1:</b> Groupement SGTP/ARGOURO (piste: Guidiguir – Gassafa: <b>31,95 km</b> )	92%	hors délai	77,4%	Chantier à l'arrêt. Les travaux restant sont: 1. mise en œuvre de la couche de roulement sur 9,6 km 2. pose de la signalisation 3. réalisation des fossés
<b>Lot 2:</b> Entreprise Dar Es Salam (Construction /Réhabilitation des pistes Bandé – Edo –Baban Ruwa: <b>48,54 km</b> )	100%	-	100%	Réception provisoire du prononcée le 04 mars 2017
<b>Lot 3:</b> Entreprise Ibrahim Molid Achèvement de la réhabilitation de la piste rurale Matameye– Doungou- Majéma (42,70 km)	75%	67%	44%	marché résilié et recrutement de l'entreprise Molid Ibrahim suite à une consultation restreinte. Démarrage des travaux le 15/04/2017 pour un délai de 3 mois, rythme satisfaisant.

21. Le rythme d'avancement du chantier du lot 3 laisse présager la fin des travaux et leur réception provisoire avant la fin du mois de juillet 2017. Par contre, le chantier du lot 1 est à l'arrêt sans perspective rassurante de redémarrage des travaux; leur achèvement n'est par conséquent pas assuré dans un délai raisonnable. *Afin de permettre d'engager les procédures de clôture du PPI-Ruwanmu, la mission a recommandé pour le lot 1: (i) la résiliation du marché et (ii) l'exécution en régie des travaux essentiels pour assurer les conditions de sécurité des usagers de la piste (signalisation).*

22. A la suite de la résiliation du marché du lot 3, l'entreprise Mondial Transco n'a pas accepté la liquidation à l'amiable et a engagé une procédure en contentieux devant la justice du Niger. Cette procédure est toujours en attente de règlement. *En tenant compte des délais non maîtrisables de cette procédure, le projet devra se concerter avec les services techniques compétents pour trouver des alternatives afin que cette situation ne constitue pas une entrave à la clôture du PPI-Ruwanmu.*

#### **Travaux des pistes sur guichet PUSADER+**

23. Ces travaux qui ont concerné la construction/réhabilitation d'un linéaire total de 108,44 km de pistes rurales dans les régions de Maradi (93,08 km) et de Tahoua (15,36 km) visent à relier les bassins de production aux marchés en vue d'améliorer la commercialisation des produits agropastoraux. Les travaux ont été scindés en 5 lots et attribués à 5 entreprises ou groupements d'entreprises comme suit:

**Tableau 2: Données des marchés de travaux des pistes PUSADER+**

Lot	Tronçon de piste	Longueur (km)	Entreprise	Montant des travaux (FCFA HT)	Délai contractuel (mois)	Date de démarrage
1	Kanembakaché-Zongon Oumara	17,66	Laminou Abdou	528 061 423	08	15/02/2016
2	Kanembakaché-Issawan	16,15	SNLM/TP	493 096 604	08	
3	Dan Aïcha-Guidan Dawaya	34,97	Groupement SAGBA/GORSALA	604 688 815	10	
4	Maradi-Sarkin Yamma-Mouley	24,74	Ibrahim Molid	468 470 064	08	18/03/2016
5	Tchinkaki-Baguaya (région de Tahoua)	15,36	Groupement Ould/Mohamed et Frères	492 184 731	10	04/04/2016

24. Le contrôle et le suivi des travaux ont été assurés par le cabinet Techni Consult. Les tronçons de pistes ont été achevés et réceptionnés provisoirement entre novembre 2016 et juin 2017. Il ressort que seules les entreprises des lots 4 et 5 ont terminé les travaux dans les délais contractuels ou délais contractuels prolongés. Les entreprises en charge des lots 1, 2 et 3 ont écopé de pénalités de retard dont les montants s'élèvent à: (i) 5 808 676 FCFA pour le lot 1, (ii) 493 097 FCFA pour le lot 2 et (iii) 29 025 063 FCFA pour le lot 3.

25. **Au titre de la composante C,** la mission note que l'organisation de l'enquête d'impact SYGRI final n'a pas encore démarré car cette activité est prévue au cours du 3ème trimestre de l'année 2017.

## D. État d'avancement de l'exécution du Projet de Petite Irrigation Ruwanmu (PPI Ruwanmu)

26. **Coordination et Gestion.** La Coordination du PPI Ruwanmu est assurée par son ancien Coordinateur National, maintenant Assistant Technique Senior du ProDAF en Charge du Dialogue Politique. La mise en œuvre est assurée par les équipes des URGP de Maradi, Tahoua et Zinder. Ce mécanisme de gestion ne souffre d'aucune difficulté particulière.

27. **Suivi-Evaluation.** Le Suivi Opérationnel et Suivi-Evaluation sont assurés par l'équipe de suivi-évaluation du ProDAF (CENAT et URGP). Les indicateurs du Cadre Logique du PPI Ruwanmu sont renseignés et sont à jour.

28. **Genre et ciblage.** La mission a noté que les femmes et les jeunes étaient peu présents parmi les promoteurs des DMP d'irrigation financés dans le cadre du test conduit en 2016 (ex.: 0% de femmes à Zinder; 1% de jeunes à Tahoua). Cependant, à Maradi une union de 7 groupements féminins et un masculin a eu accès au financement à coûts partagés par la BAGRI sur 0,5 ha mis à la disposition par la mairie de Tessaoua, et a même pu étendre sa parcelle (jusqu'à 1,5 ha). Sur la base de cette expérience, l'un des trois petits périmètres irrigués prévus par l'URGP (10 ha) sera créé dans la même zone pour soutenir l'accès à l'irrigation de l'union.

## E. Aspects fiduciaires

29. **Gestion financière.** Au 31 mai 2017, les réalisations financières du PTBA s'élèvent à 356 724 329 F CFA, soit un taux de réalisation global de 65%. La prise en compte des engagements en cours devant faire l'objet de liquidation, élèvera ce ratio à 123%, au 31 décembre 2017.

**Tableau 3:** Situation de réalisations financières par composante (en FCFA)

Composantes et Sous Composantes	Exécution PTBA 2017					
	Montant Total PTBA 2017	Montant total décaissé au 31 mai	Taux de réalisation au 31/05/2017	Engagements à liquider en 2017	Montant total des réalisations au 31 déc. 2017	% au 31/12/17
Composante A. Expansion et renforcement durable des systèmes de petite irrigation	-	-	-	-	-	-
Composante B: *Développement d'infrastructures économiques	527 525 101	356 762 023	68%	286 530 158	643 292 181	122%
Composante C: Coordination et gestion du Projet	20 000 000	- 37 694	0%	30 524 000	30 486 306	152%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>547 525 101</b>	<b>356 724 329</b>	<b>65%</b>	<b>317 054 158</b>	<b>673 778 487</b>	<b>123%</b>

30. Le montant des engagements est constitué des éléments suivants:

- solde des contrats de travaux du lot 1 (179 521 466 FCFA), lot 2 (107 017 692 F CFA) et
- dépenses envisagées dans le cadre de l'achèvement.

31. Le tableau suivant fournit un détail des engagements:

**Tableau 4: Situation des engagements**

Nature de Dépense	Code	Catégorie	Source de Financement	Engagement à liquider	Unités
<b>Composante B</b>				<b>286 539 158</b>	
Marché n°584/14/MF/DGCMP: Lot 1 Entreprise SGTP ARGOURO: 31,94 km	B1103	1	FFE	179 521 466	URGP Zinder
Marché n°585/14/MF/DGCMP: Lot 3	B1103	1	FFE	107 017 692	URGP Zinder
<b>Composante C</b>				<b>30 524 000</b>	
Audit des comptes 2016- 2017	C1204	3	FFE	10 524 000	CENAT/CN C PPI
Rapport d'achèvement Interne du PPI	C2306	3	FFE	5 000 000	CENAT/CN C PPI
Mission d'Achèvement	C2306	3	FFE	15 000 000	CENAT/CN C PPI
<b>Cumul Composante B et C</b>				<b>317 063 158</b>	

**Tableau 5: Situation des réalisations financières par catégorie de dépenses (en FCFA)**

Catégorie	Exécution PTBA 2017					
	Montant Total PTBA 2017	Montant total décaissé au 31 mai	Taux de réalisation au 31/05/2017	Engagements à liquider en 2017	Montant total des Réalisations au 31 décembre 2017	% au 31/12/2017
Catégorie 1- Génie civil et rural	527 525 101	356 762 023	68%	286 530 158	643 292 181	122%
Catégorie 2- Bien, véhicules et équipements	-	-	0%	-	-	0%
Catégorie 3 - Formation, Etudes, ateliers, assistance technique et contrats	20 000 000	-	0%	30 524 000	30 524 000	153%
Catégorie 4- Salaire et Coût de fonctionnement	-	- 37 694	0%	-	- 37 694	0%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>547 525 101</b>	<b>356 724 329</b>	<b>65%</b>	<b>317 054 158</b>	<b>673 778 487</b>	<b>123%</b>

**Tableau 6: Situation des réalisations financières par source de financement (en FCFA)**

Source de financement	Montant Total PTBA 2017	Montant total décaissé au 31 mai	Taux de réalisation au 31/12/2017	Engagements à liquider en 2017	Montant total des Réalisations au 31 décembre 2017	% au 31/12/2017
PRÊT FFE n°L-E-14-NE	465 115 631	274 314 859	59%	317 054 158	591 369 017	127%
PRÊT FIDA n°L-I-877-NE	82 409 470	82 409 470	100%	0	82 409 470	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>547 525 101</b>	<b>356 724 329</b>	<b>65%</b>	<b>317 054 158</b>	<b>673 778 487</b>	<b>123%</b>

**Tableau 7: Situation des réalisations financières par Unité de gestion (en FCFA)**

REGION / Composantes	Montant Total PTBA 2017	Montant total décaissé au 31 mai	Taux de réalisation au 31/12/17	Engagements à liquider en 2017	Montant total des Réalisations au 31 décembre 2017	% au 31/12/2017
CRC MARADI	-	-	-	-	-	-
CRC TAHOUA	-	-	-	-	-	-
CRC ZINDER	527 525 101	356 762 023	68%	286 530 158	643 292 181	122%
CNC – CELLULE NATIONAL DE COORDINATION	20 000 000	37 694	0%	30 524 000	30 486 306	152%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>547 525 101</b>	<b>356 724 329</b>	<b>65%</b>	<b>317 054 158</b>	<b>673 778 487</b>	<b>123%</b>

32. **Mobilisation de Fonds, Décaissements, Fonds de Contrepartie.** Le projet a élaboré 48 DRF depuis son démarrage en 2013, si l'on considère l'avance initiale et les dernières DRF soumises au FIDA, pour un montant global décaissé de 10 606 097 921 F CFA, soit un taux de décaissement de 100% (100%, 99% et 100% respectivement pour le Don FIDA, le Prêt FIDA et le Prêt FFE). La mobilisation sur les fonds de contrepartie de l'Etat au titre des exonérations est évaluée à un montant de 325 102 893 FCFA. Le solde du compte désigné est de 241 186 176 FCFA au 31 mai 2017. Le tableau suivant fait le point de la situation:

**Tableau 8: Niveau de mobilisation des fonds par source de financement (en FCFA)**

Performance de décaissement de Fonds par source de financement en FCFA			
Sources de financement	Coût total Projet	Fonds Décaissés au 31/05/2017	Taux Décaissement au 31/05/2017
Fonds Fiduciaire	9 183 398 000	9 183 398 000	100%
Prêt FIDA	935 653 278	926 204 904	99%
Don FIDA	498 951 648	498 951 648	100%
<b>TOTAL</b>	<b>10 617 168 130</b>	<b>10 608 554 552</b>	<b>100%</b>

33. **Audits.** L'audit externe du PPI Ruwanmu a eu pour objectif de fournir l'assurance raisonnable de la sincérité des transactions, de la conformité et du respect des Accords, de l'éligibilité des dépenses. Le rapport d'audit externe du PPI *Ruwanmu* a été livré en mai 2017. L'auditeur externe chargé de l'examen des comptes du PPI Ruwanmu relève notamment qu'au cours de l'exercice 2015, des cas de dépassements budgétaires sur la catégorie de dépenses 3 et la composante C, dans

l'ordre respectif de 5 et 8%. Toutefois, cette opinion formulée antérieurement n'est pas de nature à remettre en cause la certification des comptes.

#### **PUSADER+.**

34. La revue juge la gestion financière globalement satisfaisante. Cette analyse est par ailleurs, partagée par les conclusions des rapports d'audit externe et les vérifications antérieures.

Le projet se conforme aux procédures adoptées et aux directives applicables du FIDA. L'examen a permis de faire les constats mineurs suivants:

- En raison du statut du projet (clôture), la RAF, unique personnel fiduciaire assure toutes les tâches financières, limitant ainsi le principe de la séparation des tâches.
- Insuffisance de la documentation concernant certaines transactions, notamment celles relatives à la réception des constructions

35. Au titre des décaissements, l'Accord de Prêt qui a porté sur le montant de \$ 6 000 000, a affiché un ratio cumulé de 4% au 31 déc. 2014, 8% au 31 déc. 2015, 73% au 31 décembre 2016 et 83% au 20 juin 2017. Au 20 juin 2017, le compte bancaire affichait un solde positif de 7,344,280 CFA. Le solde reliquat de ce compte sera retourné à l'OFID.

36. Au 20 juin 2017, sur les 46 DRF émises, la situation se présente comme suit:

- Avance initiale: 01, pour 3%
- DRF: 8, soit 17%
- DPD: 37, soit 80% des décaissements

37. La revue fait observer les retards des décaissements de certains fonds. Ces retards ont parfois impacté la bonne exécution des activités du projet. Toutefois, dans l'ensemble, au 20 juin 2017, 42 DRF ont été traitées dans un temps moyen de 30-45 jours. Quatre DPD soumises sont en attente de paiement et six (6) DRF/DPD en perspective restent à finaliser d'ici le 30 juin 2017

38. Selon les dispositions de l'Accord de Prêt, la date de fin des dépenses éligibles était fixée au 31 décembre 2016. L'amendement du Prêt a porté sur l'extension de la date de clôture du PUSADER+ au 30 juin 2017 (6 mois), suite à la demande de la République du Niger à travers le Ministère du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire. Cette extension a été rendue nécessaire en raison des retards accusés sur le délai d'exécution des travaux de construction/réhabilitation des pistes à Maradi et Tahoua.

39. En ce qui concerne les opérations de clôture, il faut noter:

- i.* Certains marchés de construction de pistes rurales ont accusé des retards dans leur achèvement. Au 31 décembre 2016, les travaux n'étant pas achevés, une requête aux fins de prorogation exceptionnelle de six mois, transmise à OFID, a reçu une suite favorable. Cependant, des PV de réception existent et toutes les constructions des pistes ont été finalisées et réceptionnées provisoirement. Les dernières réceptions ont été faites en mai 2017.
- ii.* La gestion des biens acquis dans le cadre de l'exécution du projet. Ceux-ci ont été inventoriés au 31 décembre 2013 (1 445 000 FCFA, pour 1 ordinateur portable localisé à Niamey et 1 imprimante à Maradi). L'inventaire devrait être repris avant la clôture et le plan de la rétrocession devrait être fait.
- iii.* Au 20 juin 2017, la situation des engagements du PUSADER est établie à 133 500 938 FCFA (voir tableau 7 suivant). Ils portent notamment sur la mission d'achèvement, l'audit final, et les DPD en attente de paiement (DRF 41, 44 à 46).

40. Enfin, au chapitre de l'audit externe, les rapports d'audit sont finalisés, les états financiers, le compte spécial et les états certifiés des dépenses ont été certifiés sans réserve. Le rapport portant sur l'exercice 2015 comportait 4 recommandations, qui ont toutes été implémentées en 2016. Le rapport de 2016 comportait une recommandation qui devrait être mise en œuvre avant le 30 juin 2017.



41. Il convient de noter que les états financiers du projet de 2017 portant sur la période allant du 01<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2017 doivent être audités à partir du 30 juin 2017. Le FIDA a déjà validé la sélection de l'auditeur externe.

## F. Durabilité

42. **Durabilité sociale et institutionnelle:** le ProDAF poursuit la consolidation des actions mises en œuvre par le PPI Ruwanmu particulièrement en termes d'ancrage institutionnel des actions à travers le portage par les communes et autres institutions locales. La responsabilisation par les structures et organisations locales a toujours été au centre de l'approche de mise en œuvre des actions. Ces éléments contribuent sans doute à la durabilité institutionnelle et sociale.

43. **Durabilité financière et économique:** les résultats encourageants obtenus par le Projet se traduisant par des augmentations des revenus des groupes cibles et constituent une base de durabilité économique certaine. Les producteurs seront à mesure de poursuivre les activités qui sont économiquement soutenables comme l'ont montré les résultats des analyses économiques et financières.

44. **Durabilité technique:** elle repose entre autres sur les structures d'encadrement CEP et CEPM au sein desquels les interventions sont exécutées par un pool de formateurs et par la mise à disposition du guide national en la matière. Cet indispensable volet, exécuté en partenariat avec les GSC, ONG et services techniques constitue la base à partir de laquelle les producteurs verront leurs compétences renforcées. Ces producteurs constitueront à terme, un puissant réservoir de compétences techniques à travers leur chaîne de formateurs aussi bien en matière de techniques de production agricoles qu'en matière d'ingénierie sociale et de gestion comptable des exploitations agricoles.

45. **Durabilité environnementale:** les mécanismes de sécurisation foncière et de gestion durable des sites de récupération des terres par les communautés bénéficiaires sont initiés par le Projet et se **poursuivent** dans le cadre du ProDAF. Cependant, le renforcement des capacités des structures et leurs consolidations doivent être bien pris en compte par les URGP.

## G. Autres: Achèvement du PPI Ruwanmu et du PUSADER+

46. Au PPI Ruwanmu, Compte tenu des difficultés liées au non-respect des délais contractuels observées sur les chantiers des pistes en cours dans la région de Zinder, des mesures correctives de sous-traitance ont été trouvées pour la finalisation dans les meilleurs délais de 2 lots sur 3. Pour le 3<sup>ème</sup> marché, le Projet a procédé à une résiliation afin de confier la finalisation des travaux à une autre Entreprise. Les travaux se poursuivent normalement et les perspectives d'achèvement sont bonnes.

47. Le calendrier des activités d'achèvement du PPI Ruwanmu se présente comme suit:

Activités	Date butoir
Préparation et soumission du plan de recouvrement de l'avance initiale	Immédiat
Etudes effets – impacts du projet (en cours)	
Enquêtes et rapports SYGRI (du 01 au 15 octobre 2017)	15 octobre 2017
Finalisation du rapport interne d'achèvement	30 novembre 2017
Revue d'achèvement	01 au 15 décembre 2017
Transmission du rapport d'achèvement au FIDA	31 janvier 2018
Audit de clôture	Janvier 2018
Clôture anticipée	Mars 2018

## **H. Conclusion**

48. La mission adresse ses remerciements au Gouvernement de la République du Niger pour l'accueil chaleureux et la disponibilité des autorités aussi bien au niveau central et régional tout au long de la mission.

49. Les dossiers les plus urgents du PPI sont la finalisation des pistes et la mobilisation de la contrepartie pour la prise en charge des activités résiduelles.

50. Il sera important dans les mois qui viennent de capitaliser les leçons tirées de la mise en œuvre du PPI Ruwanmu d'une part concernant la gestion des chantiers de pistes et les solutions que le projet a trouvé pour gérer les difficultés rencontrées avec les entreprises de BTP et d'autre part concernant le test du mécanisme à coûts partagés dans le cadre du financement de la petite irrigation. Ces leçons seront cruciales pour aider à une mise en œuvre sereine ProDAF.

51. Le FIDA et le Gouvernement du Niger entérinent les conclusions de la mission conjointe de supervision.

## Appendice 1: Résumé de l'état d'avancement du PPI Ruwanmu et notes attribuées

Projet 1646 [1100001646]

### Faits essentiels

Pays	Niger	No. du projet	1646 [1100001646]	No. du prêt/don DSF	1000004321, 1000004323, 1000004327
Projet	Ruwanmu Small-Scale Irrigation Project			Prêt/don DSF suppl.	
Date de mise à jour	10/11/2016				
Inst. responsable de la supervision	IFAD				
Nbre de Supervisions	7	Nbre de missions avancement de l'exécution/suivi	1		
Dernière Supervision	23/06/2017	Dernière mission avancement de l'exécution/suivi	05/08/2013		

					Million USD	% Taux de décaissement
Approbation	21/09/2012			Coût total	25.65	
Accord	25/10/2012	Délai d'entrée en vigueur	5.0	FIDA Total	2.78	
Entrée en vigueur	19/02/2013	Valeur PAR	-----	Prêt du FIDA	1.78	87
Premier décaissement	20/03/2013			Don DSF		
Examen à mi-parcours	30/11/2015	Dernier amendement		Don FIDA	1.00	100
Achèvement initiale	30/06/2018	Dernier audit	<b>Après le 30/06/2017</b>	field_asap_grant	0.00	0
Achèvement	30/06/2018			Financement national total	4.11	
Clôture	31/12/2018			National Govern	4.11	
Nbre de prolongations	0			Cofinancement total externes	18.76	
				Spanish Fund	18.76	100

### Notes concernant l'exécution du projet

B.1 Aspects fiduciaires	Précédente	Actuelle	B.2 État d'avancement de l'exécution du projet	Précédente	Actuelle
1. Qualité de la gestion financière	5	5	1. Qualité de la gestion du projet	4	4
2. Acceptabilité du taux de décaissement	6	6	2. Exécution du S&E	4	4
3. Fonds de contrepartie	3	4	3. Cohérence entre le PTBA et l'exécution	5	5
4. Conformité à l'accord de financement	4	4	4. Prise en compte de l'équité hommes- femmes	4	4
5. Conformité aux règles de passation des marchés	5	5	5. Lutte contre la pauvreté	5	5
6. Qualité et ponctualité des audits	5	5	6. Efficacité du ciblage	5	5
			7. Innovation et leçons apprises	5	5
			8. Prise en compte climat et environnement	5	5

B.3 Produits et réalisations	Précédente	Actuelle	B.4 Durabilité	Précédente	Actuelle
1. Petite irrigation	5	5	1. Renforcement des institutions (organisations, etc.)	5	5
2. Renforcement des capacités	5	5	2. Autonomisation	5	5
3. Infrastructures	4	4	3. Qualité de la participation des bénéficiaires	5	5
			4. Adaptabilité des prestataires de services	4	4
			5. Stratégie de désengagement (préparation et qualité)	5	5
			6. Possibilité répliation à plus grande échelle	5	5

#### B.5 Justification des notes

##### Aspects fiduciaires.

Les activités et engagements du projets sont assez simple et le nombre d'opérations à traiter est réduit et se fait avec diligence. Les procédures financières sont strictement respectées et il existe un personnel dédié pour la gestion des opérations financières. Le taux de décaissement du financement global est très satisfaisant et se situe à 100%, 99% et 100%, respectivement pour le Don FIDA, le Prêt FIDA et le Prêt FFE, la revue considère les objectifs atteints et justifie ainsi sa notation. Bien que parfois tardive, la mobilisation des fonds de contrepartie sous la forme d'exonérations fiscales a été effective. Dans l'ensemble, il est constaté la conformité aux dispositions des Accords de Financement et les audits externes sont conduits et les rapports produits soumis dans les temps impartis

## Évaluation globale et profil de risque

	Précédente	Actuelle
C.1 Actifs physiques/financiers	4	4
C.2 Sécurité alimentaire	5	5
C.3 Qualité de l'amélioration des actifs naturels et la résilience climatique	5	5
C.4 Avancement globale de l'exécution (Sections B1 et B2)	5	5

Justification des notes sur l'avancement globale de l'exécution

C.5 Probabilité de réalisation des objectifs de développement (section B 3 et B4)	5	5
---	---	---

Justification des notes sur les objectifs de développement

Les objectifs du développement sont repris dans le cadre du ProDAF. Les 2500 hectares de petite irrigation sont repris sur le ProDAF, financement Etat du Niger.

#### C.6 **Risques** Description succincte des principaux risques concernant chaque section ainsi que de leur impact sur la réalisation des objectifs de développement et la durabilité des résultats

<b>Aspects fiduciaires</b>	Pas de risque majeur identifié. Il est attendu la clôture effective du PUSADER+
Avancement de l'exécution du projet	A ce stade de l'avancement des pistes de la région de Zinder, l'achèvement anticipé prévu pour octobre – Novembre 2017 pourrait bien se faire.
Produits et réalisations	Pas de risque
Durabilité	Poursuite de la consolidation des actions mises en œuvre par le PPI Ruwanmu particulièrement en termes d'ancrage institutionnel des actions à travers le portage par les communes et autres institutions locales. La responsabilisation par les structures et organisations locales a toujours été au centre de l'approche de mise en œuvre des actions. Les CEP, CEPD, ACAP sont renforcés.

## Suivi proposé

Question/problème	Mesure Recommandée	État de calendrier	État d'avancement
Pistes non terminées	Accélérer la finalisation des travaux restants des lots 2 et 3 de pistes et effectuer leur réception provisoire..	Juillet – Septembre	

#### Observations supplémentaires

## Appendice 2: Cadre logique actualisé: état d'avancement par rapport aux objectifs, effets et produits (actualisé au 31/05/2017)

Résultats	Indicateurs		Valeurs de référence	Valeurs Cible DCP	Valeur cibles révisée	Cumul au 31/12/2016		Cumul au 31/05/2017		TR après exécution PTBA 2017	Observations	
						Réalisé	Taux de réalisation	Réalisé	Taux de réalisation			
But: Améliorer la sécurité alimentaire des populations rurales dans les régions de Maradi, Tahoua et Zinder	Taux de malnutrition infantile réduit dans les communes ciblées*°+ (réduction % des enfants en insuffisance pondérale, chroniquement mal nourris et en malnutrition aigüe)	-Taux de malnutrition chronique	<b>Global =46 %</b> Fille = 44% Garçon=48 %	< 46%	< 46%	45,5%	100%				Les données mentionnées proviennent de l'Enquête Smart 2015 MSP/INS/UNICEF / PAM/HKI/CRF Fewsnet	
		-Taux de malnutrition Aigue	<b>Global =19 %</b> Fille=17% Garçon=21 %	< 19%	< 19%	14,8%	100%					
		-Insuffisance pondérale	<b>Global=40 %</b> Fille=38% Garçon=42 %	< 40%	< 40%							
	Augmentation de l'indice d'accumulation des actifs/biens des ménages ciblés *		nd	nd							Renseigné par l'enquête SYGRI qui n'est conduite qu'à l'achèvement du projet	
	Proportion des ménages ciblés ayant amélioré leur sécurité alimentaire (réduction du nombre de mois de la période de soudure)*°d	-Proportion de ménages touchés ayant amélioré leur sécurité alimentaire	0	80%	80%		47,75%		47,75%			
-Nombre de mois de la période de soudure		6,6 mois	<= 5,6 mois	<= 5,6 mois	4	277%	4	277%		La mise en œuvre des activités du projet a permis de réduire de plus deux mois la période de soudure		
Objectif de développement: Augmenter les revenus de 65 000 ménages ruraux dans 30 communes des régions de Maradi, Tahoua et Zinder	Proportion des ménages ciblés ayant augmenté de 50% leur revenu	-Proportion de ménages ciblés ayant augmenté leur revenu	0%	70%	70%	66%	95,23%	66%	95,23%			
		-Valeur des revenus du ménage (FCFA)	<b>Maradi</b>	391 722	587 583	587 583	492 650	83,84%	492 650	83,84%	○	
			<b>Tahoua</b>	493 521	740 281,5	740 281,5	1 577 157	213,05%	1 577157	213,05%	○	Le taux s'explique par la forte valeur marchande de l'oignon qui est la principale spéculation de la région
			<b>Zinder</b>	303 860	455 790	455 790	454 270	99,67%	454 270	99,67%	○	
	Nombre de ménages ayant bénéficié des services du projet*		○ 0	65 000	65 000	44 471	68%	44 471	68%	77%	Le nbre de bénéficiaires va s'accroître avec les nouveaux de 2016 (Pistes, PI)	

Résultats	Indicateurs		Valeurs de référence	Valeurs Cible DCP	Valeur cibles révisée	Cumul au 31/12/2016		Cumul au 31/05/2017		TR après exécution PTBA 2017	Observations
						Réalisé	Taux de réalisation	Réalisé	Taux de réalisation		
	Proportion des personnes formées (en alphabétisation) sachant lire et écrire*+ (70% de la cible qui est de 3400, soit 2380 de personnes sachant lire et écrire)		0%	70%	70%	1113	48%	1113	48%	81%	Au moins les redoublants de la première campagne s'ajouteront au nbre actuel pour améliorer le taux en 2016
Effet escompté1:	Efficacité:										
La productivité des surfaces irriguées est augmentée durablement et les capacités locales de gestion durable de la ressource hydrique sont renforcées	80% des recommandations issues des rapports de suivi piézométriques sont mises en œuvre		0%	0%	80%						
	Superficies de terre améliorées (sur bassins versants) par des mesures de préservation des sols et de l'eau (ha)*		0	3 300	3 300	2 682	81%	3394, 55	103%		Le partenariat avec le PAM a permis de dépasser légèrement la cible
	% producteurs/trices agricoles faisant état d'une augmentation de leur production/rendement*+ d'au moins 20% en moyenne	-Proportion de producteurs/trices agricoles faisant état d'une augmentation de leur production/ rendement		0%	60%	60%	47,1%	69,5%	47,1%	69,5%	L'achèvement du projet / mission
		Rendements moyens des principales cultures maraichères	Oignon	25,7 T/ha	30,8 T/ha	30,8 T/ha	39T/ha	126,66%	39T/ha	126,66%	
			Chou	22 T/ha	26,5 T/ha	26,5 T/ha	14T/ha				Les données collectées sur le chou étaient insuffisantes et erronées
			Tomate	14,75 T/ha	17,7 T/ha	17,7 T/ha	34 T/ha	192,09%	34 T/ha	192,09%	
	Durabilité: (après 3 ans)										
	% des infrastructures en service (puits, forages)*		0	90%	90%						Actuellement toutes les AUE sont fonctionnelles et seront consolidées par le ProDAF
	% groupes de GRN opérationnels/fonctionnels (20 AUE)*		0	90%	90%	100%	+ 100%	100%	+100%	100%	
% des 9 entreprises en activité (PME)*		0	80%	80%	0%	0%	0%	0%	11%	Actuellement aucune PME financé. Une seule pourra être financée e 2016 par SINERGI	
Nombre de CRA publiant des lettres d'informations techniques saisonnières et organisent 3 évènements annuels (foires, échanges, forum paysan régional)		0	3	3	3	100%	3	100%	100%		
Produit attendu 1.1: La gestion durable des ressources hydriques et foncières est améliorée sur les	Nombre d'études sur le potentiel irrigable dans les régions de Tahoua, Maradi et Zinder		0	1	3	3	100%	3	100%	100%	
	Nombre de piézomètres mis en place		nd	300	300	310	103%		103%		
	Nombre de rapports de suivi piézométrique produits		nd	0	9	3	33%	6	67%	67%	
	Nombre de groupes de gestion des ressources naturelles créés/consolidés* (AUE)		0	30	20	17	85%	20	100%	100%	
	% des groupes de gestion des ressources naturelles		0	30	20	17	85%	20	100%	100%	

Résultats	Indicateurs	Valeurs de référence	Valeurs Cible DCP	Valeur cibles révisée	Cumul au 31/12/2016		Cumul au 31/05/2017		TR après exécution PTBA 2017	Observations
					Réalisé	Taux de réalisation	Réalisé	Taux de réalisation		
1 800 ha déjà aménagés et les 5 035 ha nouveaux	avec au moins 30% de femmes dans leurs instances de direction*									
	Superficies de périmètres d'irrigation aménagés ou remis en état (ha)	0	6 835	6 800	3 604	53%	3904	53%	58.3%	La prise en compte des superficies réellement mises en valeur et le complément d'aménagements permettra de rehausser la cible en fin 2016
	Nombre d'actes fonciers rédigés/octroyés (par type)	0	5 000	5 000	3 700	74%	5 500	110%		
	Nombre de COFO partenaires formés	nd	nd	30	19	63%	19	63%		
Produit attendu 1.2: Les capacités de production, de transformation, de conservation et de commercialisation des bénéficiaires sont renforcées	Nombre de champs écoles paysans maraichers mis en place	0	1 088	1 088	503	46%	503	46%		
	Nombre de jardins de case équipés+	0	17 500	8 750	1 350	15%	1 350	15%		
	Nombre de personnes formées dans le domaine d'activités génératrices de revenus (MER)	0	1 200	9	0	0%	3	33%		
	Nombre de boutiques d'intrants établis et gérés par une OP de manière économiquement durable et transparente	0	20	20	0	0%	0	-		
	Nbre de centres d'alpha fonctionnelle créés	0	136	68	36	53%	36	53%	53%	
	Nombre de personnes formées en alphabétisation fonctionnelle+°	Total	0	3 400	3 400	53%	1919	56%		Les taux vont s'améliorer avec la deuxième campagne prévue en 2016
		Homme	0	1 700	1 700	52%	880	56%		
		Femmes	0	1 700	1 700	54%	920	57%		

COMPOSANTE B: Développement d'infrastructures économiques										
Effet escompté 2: L'acheminement des produits issus de la petite irrigation et leur commercialisation est améliorée	<b>Efficacité:</b>			0	60%	60%				
	Proportion des producteurs/trices appuyés utilisant les plateformes de collecte et comptoirs									
	Diminution de 15% des pertes liées au transport et au stockage	oignon	% de perte transport	12,1%	10,29%	10,29%				Les infrastructures ne sont construites, ces indicateurs n'ont pas l'objet de suivi
			% de perte stockage	23,1%	19,64%	19,64%				
		Tomate	% de perte transport	9%	7,65%	7,65%				
			% de perte stockage	14,8%	12,58%	12,58%				
		Chou	% de perte transport	8,8%	7,48%	7,48%				
			% de perte stockage	21,5%	18,28%	18,28%				

		Poivron	% de perte transport	9,7%	8,25%	8,25%						
			% de perte stockage	11,5%	9,78%	9,78%						
	<b>Durabilité: (après 3 ans)</b>											
	Proportion de brigades communales d'entretien routier sont opérationnelles* (avec barrières de pluies fonctionnelles) en articulation avec les communes après 3 ans			0	80 %	100 %						Les brigades en cours de mises en place et d'opérationnalisation
	Proportion d'infrastructures de commercialisation, de transformation, de stockage en service après 3 ans* (par type)			0	80%	80%						
Produit attendu 2.1: Les pistes rurales de désenclavement des zones de production sont réhabilitées/construites	Routes construites/remises en état* (km)			0	150	123	48.54	39.46%	123	72%	100%	Le niveau d'avancement de travaux indique des deux tronçons un taux de 92% et 72%. Les réceptions provisoires auront lieu avant fin Aout 2017
	Nombre de brigades d'entretien routier mis en place et équipées			0	30	4	44	0%	44	100%	100%	Il s'agit 44 brigades communautaires qui vont constituer les 4 brigades indiquées dans le CL
	Nombre de barrières de pluies construites et équipées			0	30	8	0	0%	8	100%	100%	Seront mises en place après les travaux
Produit attendu 2.2: Les infrastructures communautaires de collecte et commercialisation des produits agricoles sont construites dans les lieux de concentration des productions	Nombre d'installations de commercialisation aménagées identifiées et étudiées (2 marchés et 7 plateformes de collecte et de négoce, plus de centres de collecte)			0	32	9	9	100%	9	100%	100%	
	Nombre d'installations de commercialisation aménagées et/ou remises en état (2 marchés au lieu de 2 comptoirs)			0	2	2	0	0%	0	0%	0%	Les infrastructures seront construites avec les fonds de OFID /ProDAF
	Nombre de plateformes de collecte et négoce construites/réhabilitées (7 plateformes de commercialisation au lieu des 30 centres de collecte)			0	30	7	0	0%	0	0%	0%	
	Nombre de cadres de concertation mis en place ( <i>Hadin gwiwa</i> )			0	0	15	12	80%	12	80%	80%	
	Nombre d'infrastructures de bureau construites			0	0	2	0	0%	2	100%	100%	



		Indicateurs supprimés
		Indicateurs rajoutés dans le cadre logique
		Indicateurs pour lesquels les valeurs cibles ont été modifiées
(+) Indicateur i3N		Taux d'exécution supérieur ou à égal à 70%
(*) Indicateur SYGRI		Taux d'exécution compris entre 40% et 69%
(°) indicateur FEM		Taux d'exécution inférieur ou égal à 39%
(=) indicateur désagrégé		



### Appendice 3: Récapitulatif des principales mesures à prendre dans les délais convenus

Domaine d'action	Mesure convenue	Responsables	Délais
Exécution du projet	Assurer la mobilisation effective des fonds de contrepartie en numéraire	Gouvernement Suivi par la CENAT	Immédiat
Produits	Prendre les dispositions pour assurer l'achèvement des travaux des lots 1 et 3 des pistes de la région de Zinder au plus tard le 31 juillet 2017	Coordonnateur CNC Ruwanmu, Coord URGP Zinder	Juillet 2017
Aspects fiduciaires	Assurer la conduite des opérations de clôture du PUSADER+	ATNS/Coordonnateur, Ministère Plan, Agriculture	Immédiat Action continue

## Appendice 4: État d'avancement matériel par rapport au PTBA (y compris indicateurs SYGRI)

<b>Composante B: Rubriques</b>	<b>Unité</b>	<b>Cibles PTBA 2017 prévu</b>	<b>Cibles PTBA 2017 Réalisées au 31/05/2017</b>	<b>TR PTBA 2017</b>
<b>Construction/réhabilitation des pistes rurales</b>				
Construction de la piste rurale Guidiguir – Gassafa (Nombre de Km ayant fait l'objet de réception provisoire)	Km	31,95	0	0%
Construction/réhabilitation de la piste rurale Bandé – Edo- Baban Ruwa (Nombre de Km ayant fait l'objet de réception provisoire)	Km	48,54	48,54	100%
Réhabilitation de la piste rurale Matameye –Doungou- Majéma (Nombre de Km ayant fait l'objet de réception provisoire)	Km	42,72	0	0%
<b>Composante C</b>				
Rapport d'achèvement	rapport	1	0	0%

## Appendice 5: Aspects financiers: performance financière effective par bailleur de fonds et par composante, et décaissements par catégorie

Tableau 5A: Mobilisation des fonds par source de financement (en FCFA)

Performance de décaissement de Fonds par source de financement en FCFA			
Sources de financement	Coût total Projet	Fonds Décaissés au 31/05/2017	Taux Décaissement au 31/05/2017
<b>Fonds Fiduciaire</b>	9 183 398 000	9 183 398 000	100%
<b>Prêt FIDA</b>	935 653 278	926 204 904	99%
<b>Don FIDA</b>	498 951 648	498 951 648	100%
<b>TOTAL</b>	<b>10 617 168 130</b>	<b>10 608 554 552</b>	<b>100%</b>

5A: Situation des réalisations financières cumulées par sources de financement (en FCFA)

Source de Financement	Montant alloué	Décaissement 2013-2014 – 2015	Décaissement 2016	Décaissement 2017	Engagements à liquider en 2017	Total réalisation au 31 décembre 2017	TR en fin 2017
PRÊT FFE n°L-E-14-NE	9 183 398 000	8 298 316 065	366 021 376	274 314 859	317 054 158	9 183 398 000	100%
PRÊT FIDA n°L-I-877-NE	935 653 278	684 808 976	160 049 900	82 409 470	0	927 268 346	99%
DON FIDAn°G-I-C-1390-NE	498 116 852	498 951 648	0	0	0	498 951 648	100%
ETAT EN NUMERAIRE	0	0	0	0	72 308 458	72 308 458	-
<b>Total</b>	<b>10 617 168 130</b>	<b>9 482 076 689</b>	<b>526 071 276</b>	<b>356 724 329</b>	<b>389 362 616</b>	<b>10 681 926 452</b>	<b>101%</b>

**Tableau 5B: Performance par composante: réalisations financières cumulées par Composante (en FCFA)**

Composante	Montant alloué	Décaissement 2013- 2014 – 2015	Décaissement 2016	Décaissement 2017	Engagements à liquider en 2017	Total réalisation au 31 décembre 2017	TR en fin 2017
Composante A	6 254 951 423	4 828 618 408	101 370 355	0		4 929 988 763	79%
Composante B	2 375 158 507	1 942 315 640	407 960 842	356 762 023	286 530 158	2 993 568 663	126%
Composante C	1 987 058 200	2 711 142 641	16 740 079	-37 694	30 524 000	2 758 369 026	139%
<b>Total</b>	<b>10 617 168 130</b>	<b>9 482 076 689</b>	<b>526 071 276</b>	<b>356 724 329</b>	<b>317 054 158</b>	<b>10 681 926 452</b>	<b>101%</b>

**Tableau 5C: Indicateurs de performance - Réalisations financières cumulées par Catégorie de dépenses (en FCFA)**

Catégorie financière	Montant alloué	Décaissement 2013- 2014 – 2015	Décaissement 2016	Décaissement 2017	Engagements à liquider en 2017	Total réalisation au 31 décembre 2017	TR en fin 2017
<b>1- Génie Civil et Rural</b>	5 164 650 856	4 007 381 564	495 528 336	356 762 023	286 530 158	5 146 202 081	100%
<b>2- Biens, véhicules et équipements</b>	1 689 323 943	1 480 791 114	-	-		1 480 791 114	88%
<b>3- Formation, études, ateliers, assistance technique et Contrat</b>	2 824 907 281	3 036 306 300	26 437 161	-	30 524 000	3 093 267 461	109%
<b>4- Salaires et couts de fonctionnement</b>	938 286 050	957 597 711	4 105 779	- 37 694		961 665 796	102%
<b>Total</b>	<b>10 617 168 130</b>	<b>9 482 076 689</b>	<b>526 071 276</b>	<b>356 724 329</b>	<b>317 054 158</b>	<b>10 681 926 452</b>	<b>101%</b>

## PUSADER +

Performance financière par bailleur de fonds au 31/10/2015 en milliers FCFA

**Tableau 5A Performance financière (décaissement en USD) au 20 juin 2017**

Bailleur des fonds	Montant alloué en USD	Décaissements	Pourcentage de décaissement
OFID n°1559 P	6 000 000,00	5 443 771,61	90,73%

**Tableau 5B Réalisation financière au 20 juin 2017**

Catégorie financière	Pré évaluation (Document de conception du Projet)	Montant actualisé au taux USD	Réalisations - 2015- 2016	Réalisations 2017	Engagement à liquider au 30 juin 2017	Total réalisation au 30 juin 2017	Taux Réalisation au 30 juin 2017
1. Travaux	2 484 947 480	3 155 691 164	1 826 262 872	901 725 614	24 500 000	2 752 488 486	87,22%
2. Supervision	223 052 602	286 441 022	227 464 151	82 571 039	18 007 469	328 042 659	114,52%
3. Entretien routier	51 137 686	51 686 861	22 396 500	29 659 400	-	52 055 900	100,71%
4. Renforcement capacité et Coût récurrent	49 166 295	50 534 237	73 756 432	551 760	-	74 308 192	147,05%
<b>Total général</b>	<b>2 808 304 063</b>	<b>3 544 353 284</b>	<b>2 149 879 955</b>	<b>1 014 507 813</b>	<b>42 507 469</b>	<b>3 206 895 237</b>	<b>90,48%</b>

**NB: il faut noter que le montant du financement global du Projet inscrit dans le document de conception est pour un montant de 2 808 304 063 FCFA. Ce montant a été actualisé au 20 juin 2017 pour un taux moyen de l'historique de décaissement de 590,7255473**

**Tableau 5C Etat de décaissement du Projet au 20 juin 2017**

PAYS: NIGER


Titre du Projet: Projet d'Urgence pour la Sécurité Alimentaire et le Développement Rural - PUSADER

Prêt OFID n°1559 P

**Situation au 20/06/2017: Prêt OFID n°1559P**

Composante		Montant Alloué		Décaissement			DRF /DPD en instance de paiement 41--44-45-46		DRF /DPD à établir 47- 52		Décaissement Total après paiement de DRF		
		USD	CFA	USD	CFA	%	USD	CFA	USD	CFA	USD	CFA	%
	AVANCE INITIALE - COMPTE SPECIAL			0,00	0,00						0,00	0	
C	Rural infrastructure	6 000 000,00	3 544 353 284	5 214 684,00	3 080 447 060	86,91%	156 144,80	90 993 469	72 942,82	42 507 469	5 443 771,61	3 213 947 998	90,73%
	TOTAUX	6 000 000,00	3 544 353 284	5 214 684,00	3 080 447 060	86,91%	156 144,80	90 993 469	72 942,82	42 507 469	5 443 771,61	3 213 947 998	90,73%

### DECAISSEMENT OFID

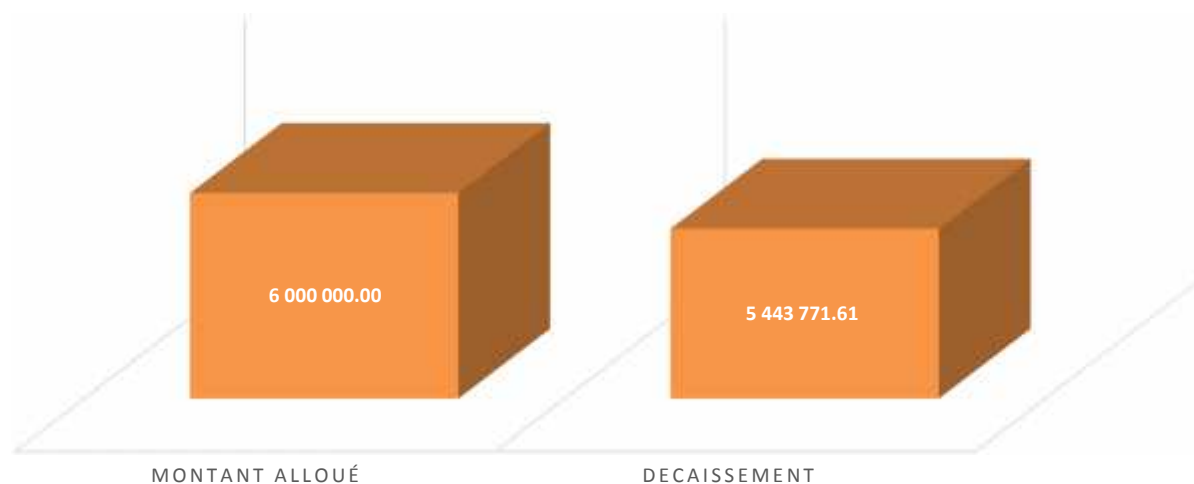



## Appendice 6: Application des dispositions de l'Accord de Financement: état d'avancement

Section	Disposition	Date prévue	État d'avancement/Date	Observations
<b>Section B</b>	L'Emprunteur fournit des fonds de contrepartie pour les besoins du projet pour un montant de 4,1 millions de dollars des Etats-Unis (USD), représentant l'ensemble des droits, impôts et taxes sur les biens et services grevant le Projet	Démarrage	Les fonds de contrepartie ont été mis à disposition du projet au fur et à mesure de la validation des demandes d'exonération	Disposition respectée
<b>Section E -1 de l'accord de financement</b>	Aucun décaissement ne sera effectué avant: a) Etablissement du Comité de Pilotage b) Attribution des fonctions de l'équipe du Projet (CNC et CRC) c) Approbation du manuel d'exécution du projet	Idem	Arrêté n°210/MAG/SG portant création du comité de Pilotage Arrêté n°221/MAG/SG du 12/12/2012 portant attribution des fonctions de l'équipe du projet	Disposition respectée
<b>Section E 2</b>	L'Accord de Financement doit être soumis à la ratification de l'emprunteur	Démarrage	La ratification par l'Emprunteur a été faite	Disposition respectée
<b>Section 7.02b</b>	L'Emprunteur/le Bénéficiaire ouvre et tient auprès d'une banque ayant l'agrément du Fonds, un ou plusieurs comptes de projet pour les opérations relatives au projet	Démarrage	Un Compte Désigné a été ouvert à Niamey et 3 comptes d'opérations ouverts à Maradi, Tahoua et Zinder	Disposition respectée
<b>Section 7.05</b>	Les marchés de biens, de travaux et de services financés par le financement seront passés conformément aux dispositions de la réglementation de l'Emprunteur/du Bénéficiaire en matière de passation de marchés, dans la mesure où celle-ci est compatible avec les directives du FIDA pour la passation des marchés	Chaque année	Avis Général de Passation des Marchés 2014 transmis au Ministère de l'Agriculture et Plan de Passation des Marchés 2014 et publié au journal Sahel n° 1576 du 24 janvier 2014. Application des procédures nationales	Disposition respectée

<b>Section 7.08a</b>	L'Emprunteur/Bénéficiaire ou l'agent principal du projet assure contre les risques l'ensemble des biens et des constructions utilisés dans le cadre du projet selon des montants conformes à de saines pratiques commerciales	Chaque année	Une police d'assurance maladie couvre le personnel, une autre se réfère aux matériels de transport (véhicules et motos) et les bâtiments. Par contre, aucune police n'assure la couverture des autres éléments d'actifs	Disposition respectée
<b>Section 7.01.b</b>	La CNC prépare annuellement un programme de travail et de budget transmis au Fonds pour avis de non objection	Chaque année	Le PTBA 2017 a été soumis et approuvé par le FIDA	Disposition respectée
<b>Section 8.03a</b>	Présentation au FIDA, des rapports d'activités (technique et financier) ainsi que le programme d'activités proposé et les progrès escomptés au cours de la période suivante	Trimestriellement	Les rapports trimestriels sont régulièrement envoyés	Disposition respectée
<b>Section 8.03b</b>	Un examen à tiers-parcours doit être réalisé conjointement par l'emprunteur et le FIDA	Non échue	Action réalisée depuis nov. 2015	Disposition respectée
<b>Section 9.02</b>	L'Emprunteur remet au Fonds chaque année fiscale des états financiers détaillés des opérations, ressources, et des dépenses relatives au projet	Avril 2017	Les états financiers du projet ont été présentés	Disposition respectée
<b>Section 9.03</b>	Présentation du rapport d'audit au FIDA	30 juin 2017	Les audits externes sont conduits et les rapports soumis dans les temps impartis au FIDA	Disposition respectée
<b>Section 11</b>	Le projet doit être exempté de tout impôt	Chaque année	Exonération effective	Disposition respectée
